

《国道47号新庄酒田道路》

しんじょうふるくち
新庄古口道路の工事状況について
～令和6年度に全線開通予定～

- 国道47号新庄古口道路のうち、新庄市大字升形～戸沢村大字津谷（延長6.0km）については、令和3年11月に発生した地すべり（トンネル変状）に対し、道路整備を一部中断し対策工事を進めてまいりました。
- 今般、地すべり対策が完了し、変状したトンネル本体の再構築（延伸含む）も専門家の助言をいただきながら進め、（仮）前波トンネルの完成に目処がたったところです。また、一部中断していた舗装工事やトンネル設備工事も進められる状況になりました。
- 今後の工事を精査した結果、**令和6年度に全線開通できる見通し**となりましたのでお知らせします。

～これまでの経緯～

- ・ 令和3年11月 施工中のトンネルに変状を確認（地すべり発生）
- ・ 令和4年 3月 開通時期の見直し
- ・ 令和4年 6月 地すべり対策の決定
- ・ 令和5年 1月 地すべり対策完了、トンネル復旧着手
- ・ 令和5年 6月 トンネル覆工コンクリート再施工開始
- ・ 令和5年 8月 全線開通時期の公表【今回】

記者発表先：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会、山形建設業界専門紙

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
副所長（道路担当） 佐藤 正（内線205）
電話：023-688-8421（代表）


国道47号 新庄酒田道路

別添

広域図



しんじょう さかた
新庄酒田道路 約50km

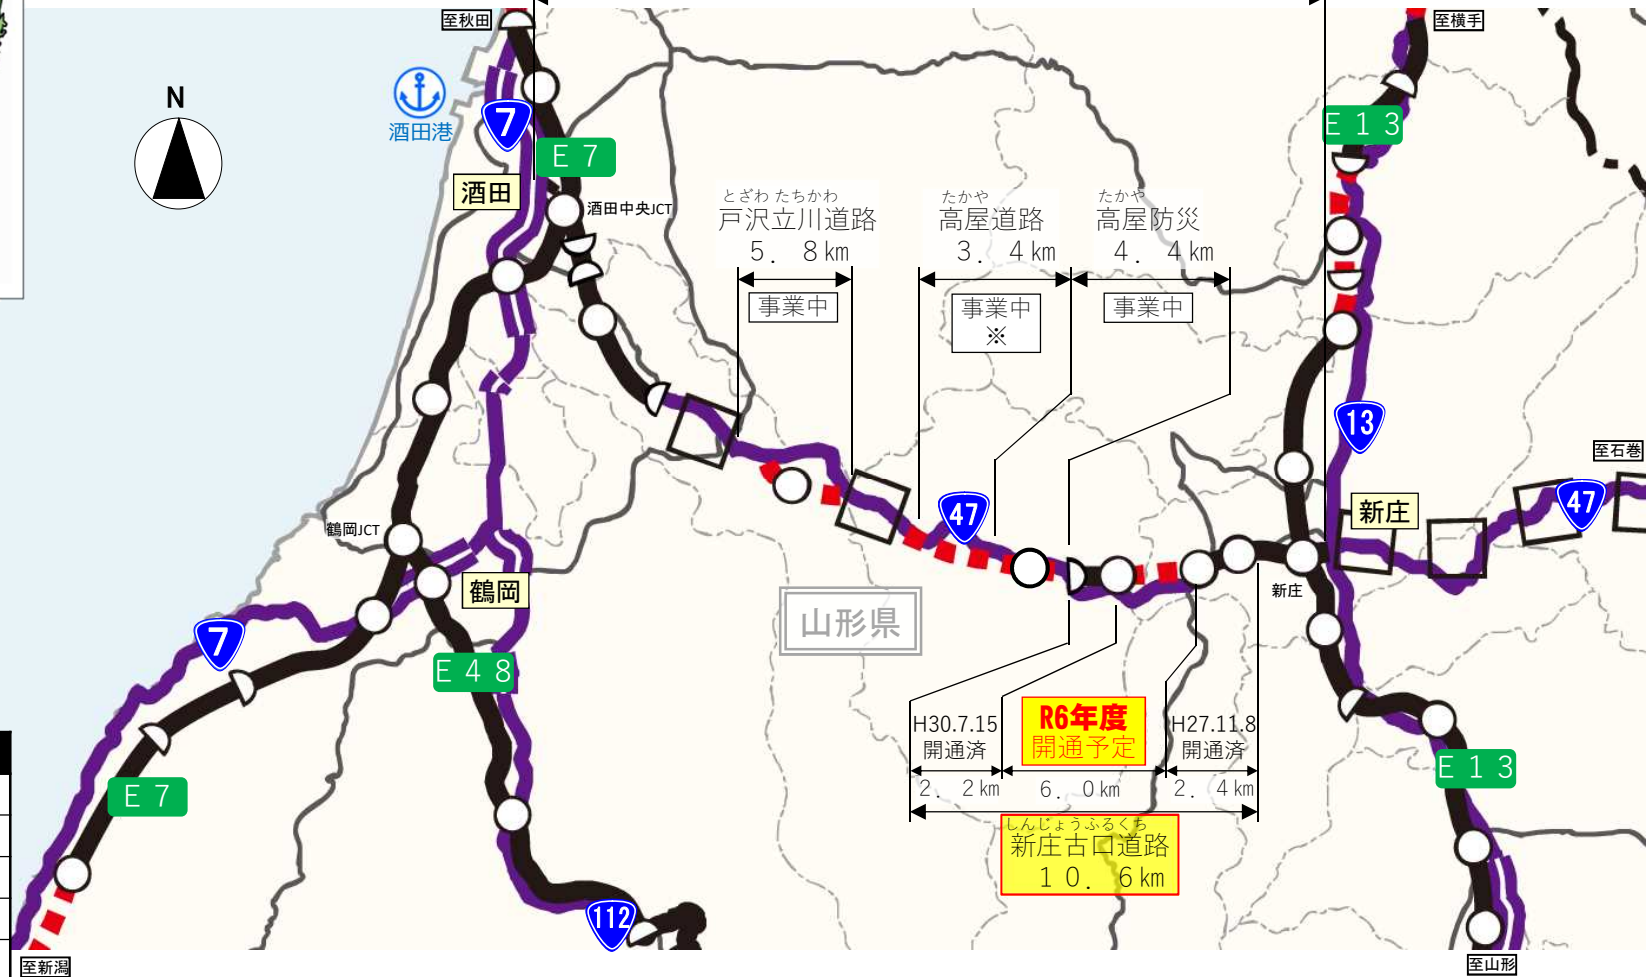

凡 例	
高規格道路	
開通済み	——
事業中
計画路線	□□□□
直轄国道	2車 4車
補助国道	——

※ 開通時期については、トンネル工事が順調に進んだ場合に工程を精査

地すべり対策の経過

別添

対策前



(グラウンドアンカー工施工状況)




(損傷したトンネルの撤去状況)



R4.9

押え盛土完了
グラウンドアンカー工施工中

対策後

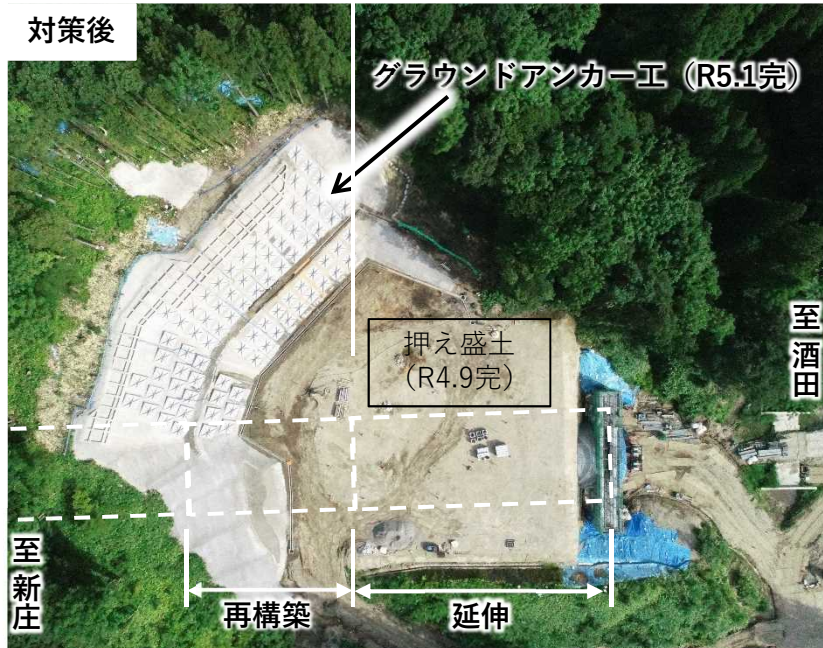

覆工コンクリート再施工開始 トンネル貫通
R5.6 R5.4

R5.1

地すべり対策完了
トンネル復旧着手

(覆工コンクリート防水工着手)



(トンネル延伸部の貫通)

