

# 八十里越道路工事レポート(9号)

発行年月日：令和5年2月  
 発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所  
 連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)



## 令和4年度末の状況

### ☆A橋梁(L=23m)

- 橋梁が概成しました。

### ☆10号スノーシェルター(L=62m)

- 7号橋梁に10号スノーシェルターが完成しました。

### ☆その他

- 1,2,3号トンネルにおいて、コンクリート舗装を施工しました。
- B橋梁は下部工を施工中です。

### ☆5号橋梁(L=337m)

- 橋梁が概成しました。  
今後、舗装、照明等設備等を計画的に施工します。

### ☆5号スノーシェッド(L=120m)

- 8号橋梁と10号トンネルの間に5号スノーシェッドが完成しました。

- 8, 9号トンネルに監査廊を設置しています。
- 8, 9, 10, 11号トンネルに照明設備を設置しました。


## 主要構造物の進捗状況

表示名(青):概成  
 表示名(赤):未完成

凡 例	
	事業区間
	国 道
	一般県道
	工事用道路

※国土交通省施工区間の  
 構造物名称は仮称です。

## ☆A橋梁(L=23m)

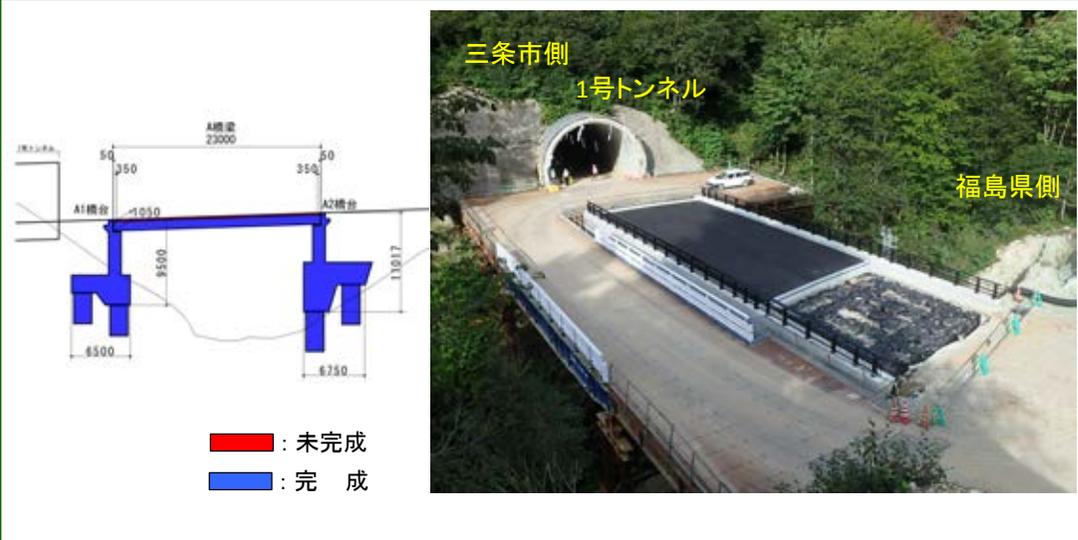

➤ A橋梁が概成しました。

## ☆5号橋梁(L=337m)



## ☆10号スノーシェルター(L=62m)




➤ 7号橋梁に10号スノーシェルターが完成しました。

## ☆5号スノーシェッド(L=120m)



➤ 8号橋梁と10号トンネルの間に5号スノーシェッドが完成しました。

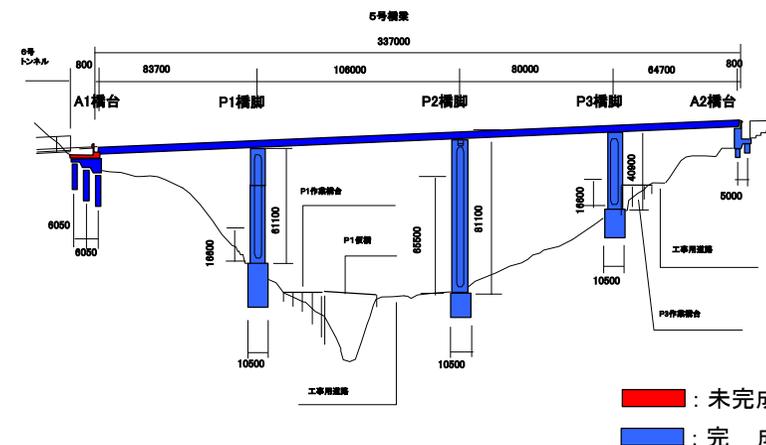

➤ 5号橋梁が概成しました。  
今後、舗装工事および照明等設備等を計画的に施工します。
